



SEZIONE A-A



FASE 1

ESECUZIONE DEGLI SBANCAMENTI E PROFILATURA DELLO SCAVO SEGUENDO IL PROFILO DI SCAVO DELLA GALLERIA NATURALE (FRANCO TECNICO Sp~10cm)

SEZIONE A-A




FASE 1bis

POSA IN OPERA DI SPRITZ-BETON DI PROTEZIONE (Sp.medio ~10cm) ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA Ø6 15x15


VISTA ASSONOMETRICA

FASE 3/4

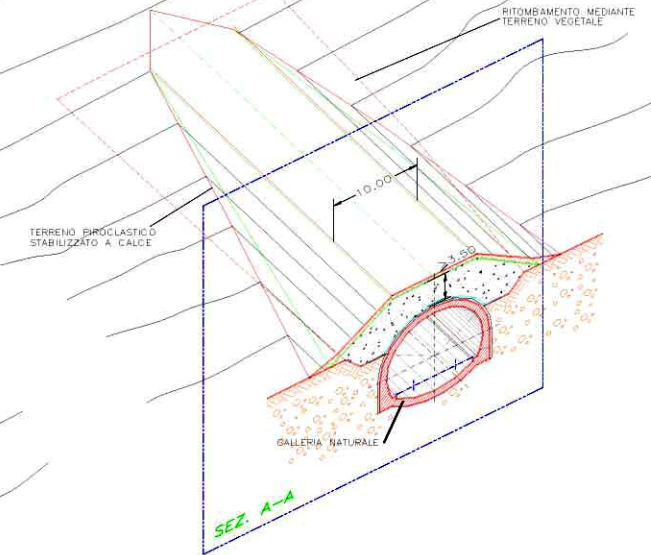

VISTA ASSONOMETRICA

FASE 1/1bis

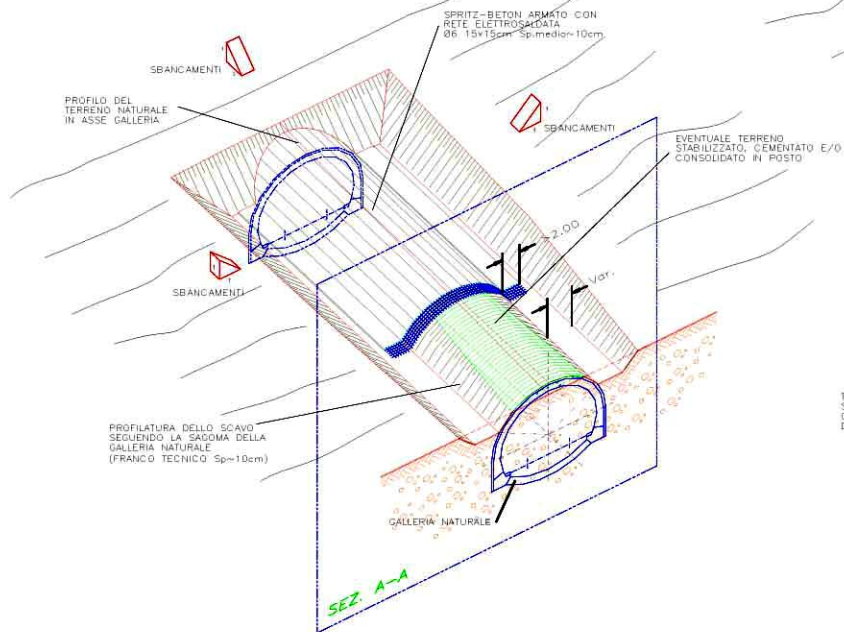


VISTA ASSONOMETRICA

FASE 2




SEZIONE A-A



FASE 2

ESECUZIONE DEL RINTERRÒ MEDIANTE MISTO DI TERRENO PIROCLASTICO STABILIZZATO A CALCE COMPATTATO PER STRATI DI ~30 cm, FINO A FORMARE UNO SPESSORE ADEGUATO IN CALOTTA DI 3,50 m (min.)


SEZIONE A-A



FASE 3

SCAVO DELLA GALLERIA NATURALE E MESSA IN OPERA DEL PRERIVESTIMENTO DI SPRITZ-BETON (Sp.~20cm) E CENTINE

SEZIONE A-A



FASE 4

GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO DELLA GALLERIA E RITOMBAMENTO DEFINITIVO MEDIANTE TERRENO VEGETALE - SISTEMAZIONE DEFINITIVA
